



IZVJEŠTAJ O NAPRETKU

Mjera: 04
Podmjera: 4.3.
Operacija: 4.3.1.

NAZIV KORISNIKA Brodsko posavska županija
ADRESA Petra Krešimira IV. 1, Slavonski Brod
DATUM ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 2. svibnja 2017.
NAZIV ULAGANJA (iz Odluke) Gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (SN Orubica)
KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU
ZAHTJEVA ZA ISPLATU (iz Odluke/Aneksa) 31.prosinac.2021.

Provedene aktivnosti:

Od zadnjeg 8. Izvještaja o napretku od 03.05.2021., provedene su u bitnom slijedeće aktivnosti na provedbi projekta, odnosno ulaganja:

- Na temelju Zahtjeva za produljenjem roka trajanja Ugovora o financiranju/projekta, odnosno krajnjeg roka za dostavu zadnjeg zahtjeva za isplatu Korisnika potpore od 02.07.2021., a koji Vam je dostavljen 08.07.2021., dostavili ste Odobrenje od 29.07.2021. čime je novi krajnji rok dovršenja projekta 31.12.2021.
- Ishođena je dana 26.05.2021. II. izmjena i dopuna Rješenja za građenje od strane nadležnog tijela s Potvrdom istog od 25.06.2021. da je pravomoćna od dana 21.06.2021. (navedena II. izmjena i dopuna Rješenja za građenje s Potvrdom kao i pripadajuća II. izmjena i dopuna glavnog projekta, a sukladno Pravilniku o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), Vam je dostavljena u okviru Zahtjeva za isplatu br. 3. od 02.07.2021.)
- Sklopljen je Ugovor o hidrogeološkim radovima (istražni piezometri) za potrebe sustava javnog navodnjavanja Orubica dana 12.10.2021. između Hrvatskih voda, Korisnika potpore i Geokol d.o.o., sve sukladno mjerama zaštite okoliša iz Rješenja nadležnog tijela i prethodno izrađenog elaborata/programa, a koja se trebaju provesti prije stavljanja sustava u funkciju i čine osnovu za monitoring u fazi eksploatacije koja će realno biti s početkom vegetacijske sezone u 2022. godini kad počinje navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Navedeni Ugovor se ne šalje u APPRRR na odobrenje, osim ako APPRRR dostavu ne zatraži, iz razloga što je sami Ugovor sklopljen 2021. godine pa sukladno važećem Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18) isti ne može biti odobren (iako je prihvatljiv) jer je nabava provedena nakon 12 mjeseci od potpisa Ugovora o financiranju.
- Realizacija projekta se nastavila, odnosno dovršila u ovom razdoblju te je u tablici u Prilogu 2. ovog Izvještaja dan pregled svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta sukladno tablici troškova i koristi iz zahtjeva za potporu, odnosno iz zadnje Obavijesti o izmjeni Obavijesti APPRRR-a od 10.11.2020. kao i njihova realizacija po godinama od 01.01.2014. – 27.10.2021. (Napomena: Za ugovore označene crvenom bojom u tekstu prikazan je samo ukupno prihvatljivi iznos od ukupnog iznosa ugovora, odnosno onaj koji je plaćen izvršiteljima isključivo od strane Korisnika potpore ne i onaj dio troškova ugovora plaćen prije 01.01.2014. ili sufinanciran iz Proračuna RH iza 01.01.2014.).



- Radovi su završeni 23.07.2021., Uporabna dozvola je ishođena 16.09.2021. od nadležnog tijela s Potvrdom istog od 17.09.2021. da je pravomoćna od 17.09.2021., sve u ugovornim rokovima (biti će predana u APPRRR u okviru zadnjeg Zahtjeva za isplatu br. 4.)
- Primopredaja Investitoru i okončani obračun je obavljena 29.09.2021., a Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu su dostavljena s 07.10.2021., sve u ugovornim rokovima (Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu s Jamstvom biti će predani u APPRRR u okviru zadnjeg Zahtjeva za isplatu br. 4.)
- Dana 11.10.2021. u nadležno tijelo je predan Zahtjev za ishođenje vodopravne dozvole sukladno važećem Zakonu o vodama i pripadnim podzakonskim propisima te je ista u postupku ishođenja (biti će predana u APPRRR u okviru zadnjeg Zahtjeva za isplatu br. 4.)
- U tablici u Prilogu 1. ovog Izvještaja dan pregled svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta sukladno tablici troškova i koristi iz zahtjeva za potporu, odnosno iz zadnje Obavijesti o izmjeni Obavijesti APPRRR-a od 10.11.2020. kao i njihova realizacija po godinama od 01.01.2014. – 27.10.2021. (Napomena: Za ugovore označene crvenom bojom u tekstu prikazan je samo ukupno prihvatljivi iznos od ukupnog iznosa ugovora, odnosno onaj koji je plaćen izvršiteljima isključivo od strane Korisnika potpore ne i onaj dio troškova ugovora plaćen prije 01.01.2014. ili sufinanciran iz Proračuna RH iza 01.01.2014.).
- Sukladno važećem Pravilnika o provedbi mjere...(NN 62/16, 101/17 i 111/18), Korisniku potpore je, na temelju dostavljenog zahtjeva za isplatu 1. i 2. rate (uključuje i pravdanje isplaćenog predujma), plaćeno/pravdano:

Ukupno Zahtjev 1 i 2 (kn s PDV-om)	
Ukupno neodobren trošak 1. (dio izvedenih I. dodatnih radova i izvedeni više rad po rekapitulaciji iz 15 p.s. Izvođača prema Obavijesti o izmjeni Obavijesti od 10.11.2020.)	20.069.349,56
Ukupno neodobren trošak 2. (financijska korekcija 5% za izvedene radove po pojedinim stavkama Troškovnika zaključno s 15. p.s. Izvođača, a sukladno navedenim točno određenim stavkama na koje se financijska korekcija primjenjuje iz Obavijesti o provedenom postupku nabave od 19.04.2019.)	-436.791,05
Sveukupno plaćeno/pravdano po Odlukama o isplati od 24.02.2020., 02.09.2020. i 23.11.2020.	-377.739,61
	19.254.818,90

- Dostavljen Vam je, sukladno Pravilniku o provedbi mjere (NN 62/16, 101/17 i 111/18), Zahtjev za isplatu br. 3. od 02.07.2021., a kojeg ste zaprimili 08.07.2021. Do današnjeg dana, nije dostavljena Korisniku Obavijest o izmjeni obavijesti kao ni Odluka o isplati, a nije traženo ni pojašnjenje/dopuna i sl. Zahtjeva.

Planirane aktivnosti:

Predaja u APPRRR zadnjeg Zahtjeva za isplatu br.4. do 31.12.2021.
Realizacija Ugovora o hidrogeološkim radovima (istražni piezometri)

Klasa: 325-01/21-01/33

Urbroj: 2178/1-04-02/06-21-01

Slavonski Brod, 28. listopada 2021.



Za Korisnika
Župan

dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 1. Realizacija projekta 01.01.2014.- 27.10.2021.



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT

Prilog 2. Fotodokumentacija s gradilišta




Slika 1. Objekti (rujan 2021.)



Slika 2. Objekti (rujan 2021.)



Slika 3. CS1 i objekt za elektroopremu (rujan 2021.)

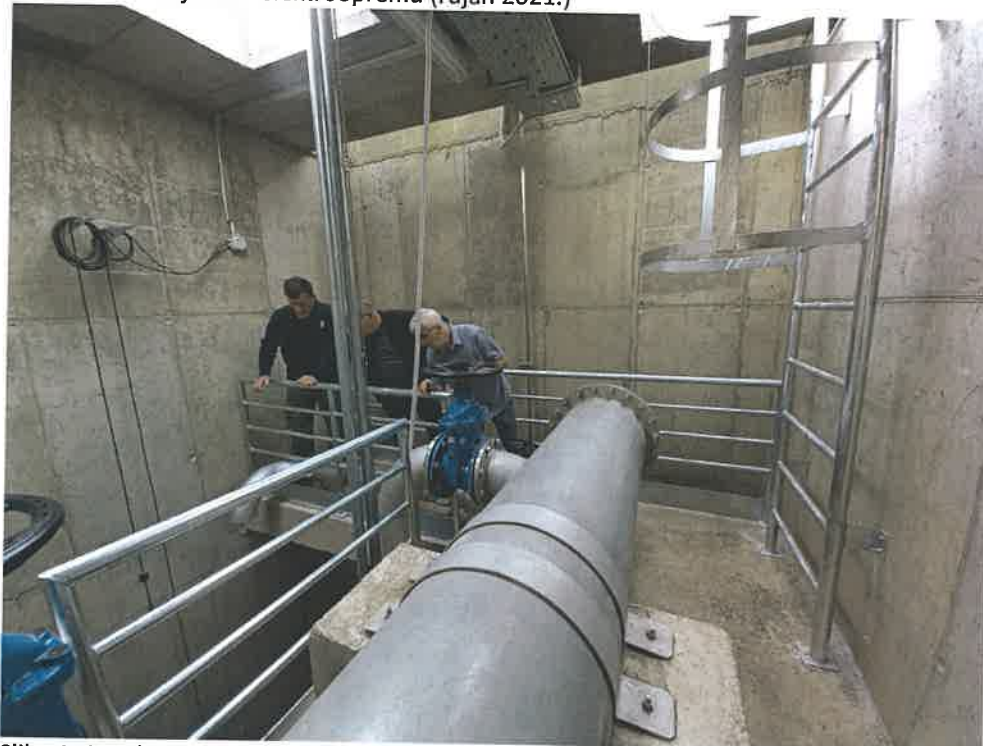

Slika 4. CS 1 (rujan 2021.)



AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI,
RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

PAYING AGENCY FOR AGRICULTURE, FISHERIES
AND RURAL DEVELOPMENT



Slika 5. Objekt za elektroopremu (rujan 2021.)



Slika 6. CS 2, retencijski bazen, taložnica (rujan 2021.)



Slika 7. CS 2 (rujan 2021.)



Slika 8. Spojno okno (hidrant) (rujan 2021.)
